

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 27

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	7761.6
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	7543.3
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	218.3
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	352
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	1045307.75
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1099147.66
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1081112.94
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	18034.72
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	1099791.24
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1079282.52
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	20508.72
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 27 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	105087.20
Аварийное обслуживание	10932.42
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	7600.00
Материалы для сварочных работ	3190.52
Обслуживание и содержание электрооборудования	44149.62
Промывка выпуска, сетей канализации	14000.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	21600.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	14272.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	220831.76
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	267375.24
Всего затрат по разделам № 1,2:	488207.00
Дератизация, дезинсекция	4805.25
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	6098.74
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	46378.73
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	3302.88
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	38257.79
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	59575.78
Ремонт металлических ограждений мусорных стоянок	38046.31
Сбор и вывоз отходов на полигон	125984.08


Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	36291.02
Транспортные услуги	11027.36
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	261451.15
Управленческое вознаграждение	109914.77
ВСЕГО РАСХОДОВ	1229340.86

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	54483.49
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	1174857.37

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 15"
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"
 Управдом

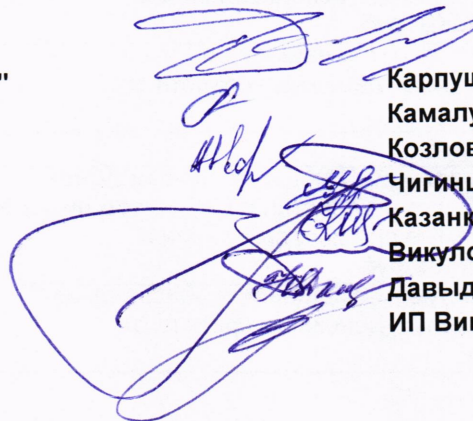

Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Козлов Н.И.
 Чигинцева М.И.
 Казанкова И.В.
 Викулов В.Д.
 Давыденко Ю.К.
 ИП Викулов Д.В.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выпол-нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 27		7091.274	554.937	346613.88	339.2978	25848.56	372462.44
	Благоустройство				265664.00		1711.24	267375.24
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1711.24	1711.24
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			265664.00			265664.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6792.932	223.574	30991.12		11407.42	42398.54
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.482	41.350	6168.25			6168.25
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.710	5.420	859.72			859.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	5.042	13.110	2079.38			2079.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.022	1.144	181.56			181.56
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	6.652	10.344	1454.34			1454.34
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	29.056	11.332	1593.25			1593.25
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запл помещен общ пользов		17.340	11.196	1592.46		1171.22	2763.68
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	1.000	0.910	127.95		0.21	128.16
	Саморез	шт				1	0.21	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1.000	0.080	10.13		348.10	358.23
	Замок навесной	шт				1	348.10	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	1.000	1.697	238.60		222.00	460.60
	Саморез	шт				4	2.00	
	Шпингалет	шт				1	220.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	0.180	0.395	59.87		83.97	143.84
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0013	0.06	
	Стекло 4мм	м2				0.1854	70.69	
	Штапик оконный	м				1.4688	13.22	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.160	1.404	212.49		502.74	715.23

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
..	Стекло 4мм	м2				1.2064	459.96	
..	Штапик оконный	м				4.7328	42.60	
..	Снятие дверных пружин	шт	4.000	0.788	110.79			110.79
..	Установка пружин (б/у)	шт	9.000	5.922	832.63		14.20	846.83
..	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
..	Шуруп 15*2	кг				0.64	13.70	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1729.800	18.451	2649.48			2649.48
..	Очистка подвалов от мусора	м2	576.600	6.919	820.27			820.27
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1153.200	11.532	1829.21			1829.21
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		7.000	4.620	638.62		279.31	917.93
..	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	7.000	4.620	638.62		279.31	917.93
..	Цемент	кг				49.7	279.31	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		70.400	24.346	3422.99		1028.89	4451.88
..	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	19.200	9.600	1349.76		1028.89	2378.65
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.528	454.22	
..	Стеклоткань	м				15.616	574.67	
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4870.560	101.059	13225.54		6333.82	19559.36
..	Выкашивание газонов	м2	4800.000	48.000	6230.88		471.41	6702.29
..	Леска 3,0	м				36.72	351.41	
..	Масло SHTIL	л				0.24	120.00	
..	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		67.10	427.26
..	Олифа	кг				0.16	8.96	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.34	28.90	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.34	29.24	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	11.000	6.820	877.26		308.88	1186.14
..	Олифа	кг				0.33	18.48	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.2	187.00	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.1	103.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		41.34	227.85
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.133	12.50	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.133	11.30	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.133	12.50	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		41.04	227.55
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	17.20	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	18.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.510	1.714	247.08		179.33	426.41
..	Олифа	кг				0.2401	13.44	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9516	165.89	
	Окраска поверхности песочницы	песочница	1.000	0.660	84.90		46.68	131.58
..	Олифа	кг				0.03	1.68	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.25	23.50	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.25	21.50	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	21.160	7.511	1069.51		971.60	2041.11
..	Олифа	кг				2.116	118.49	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.0585	99.50	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.0452	173.83	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.4095	132.49	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.9656	255.04	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.0452	192.25	
	Окраска турника	турник	3.000	2.100	270.12		54.66	324.78
..	Олифа	кг				0.12	6.72	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.255	23.97	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.255	23.97	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	1.000	1.530	196.80		35.82	232.62
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.18	15.30	
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.18	15.48	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	4.000	1.640	210.95		536.36	747.31
..	Гвозди 3*80	кг				0.4	16.36	
..	Доска обрез. 25*150*2000	шт				4	520.00	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	6.000	9.900	1273.44		1958.43	3231.87
..	Доска строг.40*150*2200	шт				7.5	1650.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Шуруп 30*3	кг				0.06	2.43	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.6	306.00	
..	Ремонт деревянных элементов игровых и спортивных комплексов	м2	0.890	1.104	157.13		68.72	225.85
..	Гвозди 60*2,5	кг				0.089	3.72	
..	Доска обрез. 25*150*2000	шт				0.5	65.00	
..	Ремонт детского игров. оборудов, кач. - маятн., карус. с замен. поврежд. досок, труб с послед. окраск	1 качеля	2.000	9.900	1273.44		675.73	1949.17
..	Болт	шт				2	4.50	
..	Доска строг. 40*150*2200	шт				1	220.00	
..	Цепь д 10	м				1.2	387.60	
..	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.7	61.60	
..	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской	1 качеля	1.000	2.200	282.99		876.72	1159.71
..	Сиденье метал. для качели	шт				1	553.72	
..	Цепь д 10	м				1	323.00	
..	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	дерево	1.000	2.280	317.85			317.85
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		19.750	12.482	1865.97		1564.83	3430.80
..	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	6.000	6.300	999.31		5.23	1004.54
..	Гвозди 40*2	кг				0.12	5.23	
..	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		196.69	282.46
..	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
..	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
..	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	57.91		130.46	188.37
..	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
..	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	130.28	
..	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1033.94	1329.20
..	Проволока вязальная	кг				0.025	1.14	
..	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1032.80	
..	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	4.750	2.009	282.49		1.08	283.57
..	Проволока вязальная	кг				0.0237	1.08	
..	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		0.50	86.27
..	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
..	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		196.93	256.40
..	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
..	Саморез	шт				2	0.42	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		29.600	6.340	912.20		852.49	1764.69
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	26.600	5.320	747.99		406.62	1154.61
	Цемент	кг				72.352	406.62	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	3.000	1.020	164.21		445.87	610.08
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1.5	445.87	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	3.730	515.60		176.86	692.46
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	314.94		123.67	438.61
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	29.42	
	Саморез	шт				4	2.00	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		53.19	253.85
	Саморез	шт				2	1.00	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.16	14.19	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		291.342	330.593	49850.50		12649.33	62499.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	59.900	9501.34		249.59	9750.93
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		249.59	5963.08
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	13.60	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		223.342	270.693	40349.16		12399.74	52748.90
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.500	1.935	260.59		341.08	601.67
	Скотч прозрачный	шт				2	120.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.075	220.48	


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	26.761	39.071	5493.40			5493.40
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.500	7.585	1221.11		1994.81	3215.92
	Скотч прозрачный	шт				2.855	172.16	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	1822.65	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.350	5.309	854.78		1396.46	2251.24
	Скотч прозрачный	шт				2	120.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.434	1275.86	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	23.081	92.324	14644.44			14644.44
	Очистка и промывка участков трубопровода после выполнения ремонтно-строительных работ	м	2.500	0.750	101.00			101.00
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23		7.43	3993.66
	Сода каустическая	кг				0.2	7.43	
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	29.000	35.960	4842.73			4842.73
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раструб	2.000	1.400	196.84		15.54	212.38
	Паста 250 гр	шт				0.12	13.80	
	Цемент	кг				0.29	1.74	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	1.800	2.628	369.50			369.50
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.200	1.756	247.01			247.01
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	176.54		502.23	678.77
	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	176.54		487.10	663.64
	Лен сантехнический	кг				0.0122	8.30	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	176.54		495.99	672.53
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	139.14		118.86	258.00
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.800	6.336	1005.02		692.09	1697.11
	Лен сантехнический	кг				0.0023	0.46	
	Труба ду 32	т				0.0148	691.63	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	70.59		61.03	131.62
	Отвод ду 15	шт				1	22.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Резьба Д15	шт				1	8.00	
..	Труба ду 15	т				0.0006	31.03	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.200	1.188	188.44		116.07	304.51
..	Резьба Ду20	шт				1	11.00	
..	Труба 20	т				0.002	105.07	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	211.76		93.59	305.35
..	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.51	
..	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	0.800	0.792	125.63		81.49	207.12
..	Лен сантехнический	кг				0.0004	0.27	
..	Резьба Ду20	шт				1	11.00	
..	Труба 20	т				0.0013	70.22	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	0.500	0.545	86.45		55.86	142.31
..	Лен сантехнический	кг				0.0002	0.17	
..	Труба 25	т				0.0012	55.69	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	10.100	13.332	2114.72		1503.40	3618.12
..	Лен сантехнический	кг				0.005	2.00	
..	Резьба Д32	шт				2	40.12	
..	Труба ду 32	т				0.0313	1461.28	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	5.000	5.450	864.48		576.67	1441.15
..	Лен сантехнический	кг				0.0025	0.92	
..	Труба 25	т				0.012	575.75	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.250	2.002	317.64		155.92	473.56
..	Лен сантехнический	кг				0.0008	0.29	
..	Резьба Д15	шт				2	16.00	
..	Труба ду 15	т				0.0027	139.63	
..	Смена полиэтиленовых канализационных труб: диаметром 100,150мм	м	2.000	1.420	232.14		1916.70	2148.84
..	Муфта 160	шт				1	256.50	
..	Паста 250 гр	шт				0.24	27.60	
..	Ревизия с крышкой ду160	шт				1	802.80	
..	Труба с раструбом 160*2000	шт				1	829.80	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	1.000	0.330	51.76		40.32	92.08
..	Контрогайка ф15	шт				1	8.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Лен сантехнический	кг				0.002	0.32	
..	Муфта ду 15	шт				1	16.00	
..	Сгон д-15	шт				1	16.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	1.000	0.480	75.28		73.45	148.73
..	Контрогайка Ду 25	шт				1	16.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.0036	2.45	
..	Муфта ду 25	шт				1	23.00	
..	Сгон 25	шт				1	32.00	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	2.000	0.960	150.57		128.03	278.60
..	Контрогайка ду 32	шт				2	22.60	
..	Лен сантехнический	кг				0.0072	3.03	
..	Муфта ду 32	шт				2	36.00	
..	Сгон 32	шт				2	66.40	
..	Укрепление кронштейнов для труб и приборов центрального отопления	шт	4.000	0.640	89.98		200.00	289.98
..	Кронштейн Ду 100	шт				4	200.00	
..	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	1.000	0.130	18.28		14.20	32.48
..	Контрогайка Ду 20	шт				1	11.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
..	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	шт	5.000	6.450	942.02		85.50	1027.52
..	Заглушка д 100	шт				2	34.20	
..	Заглушка РР 110	шт				3	51.30	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		188.02	362.50
..	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
..	Установка позелителеновых фасованных частей на трубопровод канализации	шт	7.000	4.970	743.56		1057.90	1801.46
..	Заглушка д 100	шт				1	31.50	
..	Манжета 123*110	шт				1	91.80	
..	Муфта 160	шт				1	225.00	
..	Отвод 100*90	шт				2	147.60	
..	Паста 250 гр	шт				0.84	96.60	
..	Патрубок	шт				1	50.40	
..	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				1	217.00	
..	Ревизия 110	шт				1	198.00	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		7.000	0.770	108.26		80.57	188.83

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена ламп накаливания	шт	7.000	0.770	108.26		80.57	188.83
..	Лампа 60вт	шт				7	80.57	
Итого:			7091.27	554.937	346613.88	339.2978	25848.56	372462.44

Объемы выполненных работ подтверждаю:


 подпись _____ Ф.И.О. Викторов Д.В.

