

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 28

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 | 6506.1 |
| в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2 | 6506.10 |
| - площадь нежилых помещений жилого дома, м2 | 0.00 |
| Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год) | 301 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 72822.08 |
| НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: | 1122027.53 |
| Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб. | 1121461.13 |
| Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества) | 566.40 |
| ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: | 1141959.54 |
| Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб. | 1141393.14 |
| Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества) | 566.40 |
| Прочие поступления | 0.00 |
| РАСХОДЫ | |
| Наименование работ | 15мк-н - 28 Стоимость работ, руб. |
| Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | |
| Ведомость по выполненным работам | 96434.94 |
| Аварийное обслуживание | 9838.08 |
| Материалы для сварочных работ | 2859.17 |
| Обслуживание и содержание электрооборудования | 24427.41 |
| Прочистка канализационных выпусков в МКД | 24490.00 |
| Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии | 21600.00 |
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД | 11780.00 |
| Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома | 191429.60 |
| Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории | |
| Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам) | 226792.28 |
| Всего затрат по разделам № 1,2: | 418221.88 |
| Дератизация, дезинсекция | 2473.44 |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией | 88880.20 |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией | 7990.87 |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией | 3964.83 |


| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией | 85308.77 |
| Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос | 765.70 |
| Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО | 89061.92 |
| Транспортные услуги | 1500.00 |
| Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы) | 246790.51 |
| Управленческое вознаграждение | 112202.75 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1057160.87 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1069137.46 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 11976.59 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

| | |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 15"
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"
 Управдом

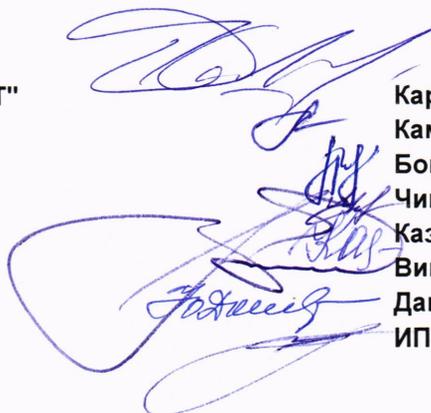

Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Богачева В.С.
 Чигинцева М.И.
 Казанкова И.В.
 Викулов В.Д.
 Давыденко Ю.К.
 ИП Викулов Д.В.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выпол нения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во ма- териалов | Стоимость материалов | Всего |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | 15мк-н - 28 | | 18260.529 | 569.546 | 302592.25 | 284.2712 | 20634.97 | 323227.22 |
| | Благоустройство | | | | 220885.00 | | 5907.28 | 226792.28 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы) | руб | | | | | 5907.28 | 5907.28 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами) | руб | | | 220885.00 | | | 220885.00 |
| | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД | | 17952.895 | 269.195 | 36159.54 | | 8554.19 | 44713.73 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 32.656 | 33.252 | 4959.31 | | | 4959.31 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м2 | 2.014 | 4.028 | 638.92 | | | 638.92 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м2 | 4.074 | 10.592 | 1680.17 | | | 1680.17 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м2 | 1.012 | 1.134 | 179.78 | | | 179.78 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м2 | 6.466 | 10.054 | 1413.68 | | | 1413.68 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м2 | 19.090 | 7.444 | 1046.77 | | | 1046.77 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 6.210 | 14.954 | 2003.54 | | 1594.46 | 3598.00 |
| | Зашивка оконных и дверных проемов фанерой | м2 | 2.500 | 1.265 | 162.72 | | 678.90 | 841.62 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.025 | 1.26 | |
| | Фанера 1,525*1,525*6мм | м2 | | | | 2.55 | 677.64 | |
| | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете | шт | 2.000 | 11.620 | 1564.86 | | 169.90 | 1734.76 |
| | Гвозди 3*70 | кг | | | | 0.08 | 3.27 | |
| | Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг | шт | | | | 0.483 | 166.63 | |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2 | м2 | 1.710 | 2.069 | 275.96 | | 745.66 | 1021.62 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.0051 | 0.26 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 1.7784 | 675.63 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 6.9768 | 69.77 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 423.900 | 4.239 | 596.00 | | | 596.00 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| .. | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 423.900 | 4.239 | 596.00 | | | 596.00 |
| .. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 44.800 | 12.902 | 1814.08 | | | 1814.08 |
| .. | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 44.800 | 12.902 | 1814.08 | | | 1814.08 |
| .. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 17403.000 | 178.660 | 23235.51 | | 3796.44 | 27031.95 |
| .. | Выкашивание газонов | м2 | 17400.000 | 174.000 | 22586.94 | | 2446.44 | 25033.38 |
| .. | Леска 3,0 | м | | | | 174 | 1472.04 | |
| .. | Масло SHTIL | л | | | | 1.74 | 974.40 | |
| .. | Заполнение песочницы песком | песочница | 1.000 | 0.100 | 12.86 | | 1350.00 | 1362.86 |
| .. | Песок раств. | т | | | | 1.8 | 1350.00 | |
| .. | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | дерево | 2.000 | 4.560 | 635.71 | | | 635.71 |
| .. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 38.300 | 18.932 | 2680.10 | | 2342.92 | 5023.02 |
| .. | Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий | м | 2.800 | 0.252 | 32.41 | | 24.66 | 57.07 |
| .. | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 0.28 | 24.66 | |
| .. | Ремонт чердачных люков | шт | 1.000 | 3.032 | 480.94 | | 1.23 | 482.17 |
| .. | Гвозди 3*70 | кг | | | | 0.03 | 1.23 | |
| .. | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | шт | 3.000 | 1.290 | 173.72 | | 354.54 | 528.26 |
| .. | Проволока вязальная | кг | | | | 0.012 | 0.54 | |
| .. | Ухваты д/водосточных труб | шт | | | | 3 | 354.00 | |
| .. | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | м | 3.750 | 1.575 | 221.44 | | 775.45 | 996.89 |
| .. | Проволока вязальная | кг | | | | 0.0187 | 0.85 | |
| .. | Труба в/сточная L 1250 | шт | | | | 3 | 774.60 | |
| .. | Установка и укрепление водосточных труб (б/у) | м | 3.750 | 1.586 | 223.02 | | 0.85 | 223.87 |
| .. | Проволока вязальная | кг | | | | 0.0187 | 0.85 | |
| .. | Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб | шт | 5.000 | 3.050 | 428.83 | | 2.62 | 431.45 |
| .. | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 8 | 2.00 | |
| .. | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 2 | 0.62 | |
| .. | Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб | шт | 10.000 | 4.340 | 584.47 | | 1.81 | 586.28 |
| .. | Проволока вязальная | кг | | | | 0.04 | 1.81 | |
| .. | Установка отливов (отметов) водосточных труб | шт | 9.000 | 3.807 | 535.26 | | 1181.76 | 1717.02 |


| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| .. | Отметы водосточные | шт | | | | 9 | 1176.00 | |
| .. | Саморез 3,5*35 | шт | | | | 6 | 1.68 | |
| .. | Саморез для ГКЛ 3,5*41 | шт | | | | 12 | 4.08 | |
| .. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | | 0.029 | 1.026 | 135.66 | | 10.60 | 146.26 |
| .. | Ремонт кладки стен отдельными местами | м3 | 0.029 | 1.026 | 135.66 | | 10.60 | 146.26 |
| .. | Цемент | кг | | | | 1.4967 | 10.60 | |
| .. | Ремонт и изготовление инвентаря | | 4.000 | 5.230 | 735.34 | | 809.77 | 1545.11 |
| .. | Изготовление лопат для уборки снега | шт | 1.000 | 2.240 | 314.94 | | 414.03 | 728.97 |
| .. | Лист оцинков. 0,55 мм | т | | | | 0.0005 | 33.15 | |
| .. | Пила двуручная 1000 мм | шт | | | | 0.5 | 273.21 | |
| .. | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0.25 | 45.67 | |
| .. | Черенки д/лопат | шт | | | | 1 | 62.00 | |
| .. | Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 | шт | 2.000 | 2.240 | 314.94 | | 206.76 | 521.70 |
| .. | Болт 6*60 | кг | | | | 0.014 | 1.15 | |
| .. | Гайка М6 | кг | | | | 0.03 | 2.84 | |
| .. | Лист 0,55 оцинков. 1250*2500 | т | | | | 0.0005 | 33.25 | |
| .. | Лист 2мм 1250*2500 | т | | | | 0.0005 | 27.16 | |
| .. | Саморез 3,5*16 | шт | | | | 7 | 0.91 | |
| .. | Фанера 2440*1220 9 мм | м2 | | | | 0.25 | 95.78 | |
| .. | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0.25 | 45.67 | |
| .. | Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 | шт | 1.000 | 0.750 | 105.45 | | 188.98 | 294.43 |
| .. | Болт 6*30 | кг | | | | 0.028 | 2.93 | |
| .. | Гайка М6 | кг | | | | 0.006 | 0.57 | |
| .. | Пила двуручная 1000 мм | шт | | | | 0.3 | 163.93 | |
| .. | Труба ду 32 | т | | | | 0.0005 | 21.55 | |
| .. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД | | 307.634 | 300.351 | 45547.71 | | 6173.50 | 51721.21 |
| .. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов | | 75.819 | 60.789 | 9532.19 | | 1336.83 | 10869.02 |
| .. | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 64.000 | 16.000 | 2537.92 | | | 2537.92 |
| .. | Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП | м3 | 0.014 | 0.212 | 34.19 | | 78.33 | 112.52 |
| .. | Скотч прозрачный | шт | | | | 0.2338 | 14.10 | |
| .. | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.0174 | 64.23 | |
| .. | Изоляция трубопроводов отопления в ИТП | м3 | 0.005 | 0.076 | 12.20 | | 28.13 | 40.33 |
| .. | Скотч зеленый | шт | | | | 0.0435 | 2.57 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| .. | Скотч прозрачный | шт | | | | 0.0435 | 2.62 | |
| .. | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.0062 | 22.94 | |
| .. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз | м2 | 0.680 | 0.632 | 84.34 | | 12.90 | 97.24 |
| .. | Лак Битумный | л. | | | | 0.136 | 12.90 | |
| .. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз | м2 | 1.120 | 1.042 | 138.92 | | 21.24 | 160.16 |
| .. | Лак Битумный | л. | | | | 0.224 | 21.24 | |
| .. | Перевод ГВС по телефонограмме | шт | 6.000 | 3.000 | 475.86 | | | 475.86 |
| .. | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 2.000 | 36.020 | 5713.49 | | 1141.23 | 6854.72 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.02 | 13.60 | |
| .. | Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм | шт | | | | 2 | 700.00 | |
| .. | Масло гидравл. ТНК | кг | | | | 0.02 | 1.27 | |
| .. | Прокладки паранитовые ду 100 | шт | | | | 6 | 186.36 | |
| .. | Термометр | шт | | | | 2 | 240.00 | |
| .. | Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП | шт | 1.000 | 3.477 | 488.87 | | 55.00 | 543.87 |
| .. | Кольцо резиновое РТЕ (большое) | шт | | | | 1 | 55.00 | |
| .. | Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм | шт | 1.000 | 0.330 | 46.40 | | | 46.40 |
| .. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 231.815 | 239.562 | 36015.51 | | 4836.67 | 40852.18 |
| .. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм | врезка | 1.000 | 4.460 | 729.12 | | 281.01 | 1010.13 |
| .. | Сгон д-15 | шт | | | | 1 | 19.00 | |
| .. | Труба ду 15 | т | | | | 0.0013 | 67.97 | |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 194.04 | |
| .. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметром до 50 мм | мест | 4.000 | 2.120 | 298.07 | | 25.58 | 323.65 |
| .. | Электроды МР ду3 | кг | | | | 0.245 | 25.58 | |
| .. | Запуск системы отопления | 1000 м3 здания | 22.487 | 32.831 | 5207.65 | | | 5207.65 |
| .. | Изоляция трубопровода отопления (Термофлекс,Вилатерм) | м | 2.000 | 0.808 | 132.09 | | 123.03 | 255.12 |
| .. | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 0.046 | 2.25 | |
| .. | Энергофлекс 35*6 | м | | | | 2.2 | 120.78 | |
| .. | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.018 | 0.273 | 43.97 | | 95.28 | 139.25 |
| .. | Скотч прозрачный | шт | | | | 0.18 | 12.70 | |
| .. | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.0223 | 82.58 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------|
| .. | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальный помещ. и на л/клет. | 1000 м2 | 21.510 | 86.040 | 13647.66 | | | 13647.66 |
| .. | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 121.000 | 44.770 | 6029.17 | | | 6029.17 |
| .. | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 28.000 | 34.720 | 4675.74 | | | 4675.74 |
| .. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм | м | 3.000 | 2.130 | 348.21 | | 1076.42 | 1424.63 |
| .. | Манжета переходная 100*123 | шт | | | | 2 | 78.00 | |
| .. | Муфта ду 110 | шт | | | | 2 | 139.50 | |
| .. | Отвод 100*45 | шт | | | | 1 | 47.70 | |
| .. | Переход с чугуна на пласт. ду 100 | шт | | | | 1 | 217.00 | |
| .. | Смазка силиконовая | шт | | | | 0.75 | 96.52 | |
| .. | Тройник 100/50*87,5 | шт | | | | 1 | 63.90 | |
| .. | Труба 100*2000 | шт | | | | 1 | 270.00 | |
| .. | Труба 100/1000 | шт | | | | 1 | 163.80 | |
| .. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм | м | 3.000 | 2.940 | 466.34 | | | 466.34 |
| .. | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС | м3 | 1.800 | 2.635 | 370.51 | | | 370.51 |
| .. | Смена вентилях ХВС диаметром : 25мм | шт | 1.000 | 1.180 | 187.17 | | 486.96 | 674.13 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.012 | 8.16 | |
| .. | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 1 | 478.80 | |
| .. | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм | м | 1.000 | 1.090 | 172.90 | | 185.55 | 358.45 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0005 | 0.34 | |
| .. | Отвод 25 | шт | | | | 2 | 32.00 | |
| .. | Резьба ду25 | шт | | | | 2 | 22.00 | |
| .. | Труба 25 | т | | | | 0.0024 | 131.21 | |
| .. | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм | м | 10.500 | 13.860 | 2265.83 | | 1476.92 | 3742.75 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.004 | 2.72 | |
| .. | Отводы 32 | шт | | | | 1 | 71.30 | |
| .. | Труба ду 32 | т | | | | 0.0325 | 1402.90 | |
| .. | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм | м | 7.000 | 7.630 | 1141.52 | | 800.31 | 1941.83 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0035 | 2.38 | |
| .. | Отвод 25 | шт | | | | 1 | 25.00 | |
| .. | Труба 25 | т | | | | 0.0167 | 772.93 | |
| .. | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм | м | 1.500 | 1.335 | 187.70 | | 177.96 | 365.66 |
| .. | Бочата ду 15 | шт | | | | 2 | 28.00 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0007 | 0.51 | |
| .. | Отвод ду 15 | шт | | | | 1 | 22.00 | |
| .. | Переходник ду 15 | шт | | | | 1 | 25.50 | |
| .. | Труба ду 15 | т | | | | 0.0019 | 101.95 | |
| .. | Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм | шт | 1.000 | 0.480 | 75.28 | | 80.45 | 155.73 |
| .. | Контрогайка Ду 25 | шт | | | | 1 | 19.00 | |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0036 | 2.45 | |
| .. | Муфта ду 25 | шт | | | | 1 | 27.00 | |
| .. | Сгон 25 | шт | | | | 1 | 32.00 | |
| .. | Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура | соединение | 2.000 | 0.260 | 36.56 | | 27.20 | 63.76 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.04 | 27.20 | |
| Итого: | | | 18260.53 | 569.546 | 302592.25 | 284.2712 | 20634.97 | 323227.22 |

Объемы выполненных работ подтверждаю:


 подпись


 Ф.И.О.
ВИКУЛОВ
ДЕНИС
ВИКТОРОВИЧ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АНГАРСК
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 РОССИЯ
